



ANEXO Nº 3
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE EL CONTRATADO



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ene '16	feb '16	mar '16	abr '16	may '16	jun '16	jul '16	ago '16	sep '16	oct '16	nov '16	dic '16	ene '17	feb '17	mar '17	abr '17	may '17	jun '17	jul '17	ago '17	sep '17	oct '17	nov '17	dic '17	ene '18
1		PERIODO TOTAL DE IMPLEMENTACION	730 días?	mié 30/12/15	jue 28/12/17																										
2		Firma del Contrato de Financiamiento	0 días	mié 30/12/15	mié 30/12/15																										
3		Gestion del Proyecto	212 días?	jue 31/12/15	vie 29/07/16																										
4		Elaboracion de Propuesta Tecnica	30 días?	jue 31/12/15	vie 29/01/16	2																									
5		Entrega y Aprobacion de Propuesta Tecnica General	0 días	vie 29/01/16	vie 29/01/16	4																									
6		Levantamiento de Observaciones de Propuesta Tecnica General	10 días?	vie 29/01/16	dom 07/02/16																										
7		Aprobacion de Propuesta Tecnica General	1 día	lun 08/02/16	lun 08/02/16	6																									
8		Site Acquisition	172 días?	mar 09/02/16	vie 29/07/16	7																									
9		Estudio de Campo Red de Acceso	112 días?	mar 09/02/16	lun 30/05/16																										
10		Diseño de Red Acceso - Replanteo	46 días?	sáb 09/04/16	mar 24/05/16																										
11		Entrega de Propuesta Tecnica Definitiva Mes 4	1 día?	vie 29/04/16	vie 29/04/16																										
12		Entrega de Propuesta Tecnica Definitiva Mes 7	1 día?	vie 29/07/16	vie 29/07/16																										
13		Gestion de las Adquisiciones	161 días?	lun 04/01/16	dom 12/06/16																										
14		Preparación de orden de Compra Internacional de Infraestructura y equipos	6 días?	lun 04/01/16	sáb 09/01/16																										
15		Fabricacion y/o suministro de materiales y equipos	120 días?	mar 05/01/16	mar 03/05/16																										
16		Transporte Internacional e Internamiento	30 días?	mar 23/02/16	mié 23/03/16																										
17		Internamiento de equipos	19 días?	jue 24/03/16	lun 11/04/16																										
18		Transporte Nacional a Almacén Central	20 días?	lun 02/05/16	sáb 21/05/16																										
19		Compra local de Infraestructura y equipos	42 días?	mié 24/02/16	mar 05/04/16																										
20		Fabricacion y entrega equipamiento TELECOM Infraestructura y Materiales	56 días?	lun 07/03/16	dom 01/05/16																										
21		Transporte Local (Almacén Central - Region de Despliegue)	42 días?	lun 02/05/16	dom 12/06/16																										
22		Ejecucion del Proyecto	292 días?	lun 21/03/16	vie 06/01/17																										
23		Transporte local de equipos, Infraestructura y equipos (Desde Almacén Central a Nodos)	18 días?	lun 30/05/16	jue 16/06/16																										
24		Construccion de Obras Civiles	292 días?	lun 21/03/16	vie 06/01/17																										
25		Instalacion Infraestructura BACKHAUL	234 días?	lun 11/04/16	mié 30/11/16																										
26		Instalacion de Servicios a Entidad Beneficiarias	255 días?	lun 18/04/16	mié 28/12/16																										
27		Pruebas de equipamiento instalado	262 días?	lun 11/04/16	mié 28/12/16																										
28		Entrega de Instalacion del 60% de Entidades Beneficiarias	0 días	lun 07/11/16	lun 07/11/16																										
29		Entrega de Instalacion del 100% de Entidades Beneficiarias	0 días	mié 28/12/16	mié 28/12/16																										
30		Construccion de Capacidades	725 días?	lun 04/01/16	jue 28/12/17																										
31		Sensibilizacion y Difusion	208 días?	lun 04/01/16	vie 29/07/16																										
32		Elaboracion de Contenidos	124 días?	lun 04/01/16	vie 06/05/16																										
33		Capacitacion en Localidades Beneficiarias	348 días?	dom 15/01/17	jue 28/12/17																										
34		Capacitacion en Capitales de Distritos	348 días?	dom 15/01/17	jue 28/12/17																										
35		Monitoreo y Control	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
36		Monitoreo y Contro de los trabajos del Proyecto	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
37		Autorizacion de Trabajos	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
38		Seguimiento de Avances	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
39		Manage Project Records	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
40		Mantenion del Cronograma del Proyecto	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
41		Mantencion del Plan de Trabajo	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
42		Manege Finances	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
43		Monitor de Costos	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
44		Control de Costo	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
45		Mantencion del Plan Financiero	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
46		Control de Calidad	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
47		Pruebas de Calidad	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
48		Niveles de Calidad	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
49		Monitoreo y Control de Riesgos	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
50		Administracion de Riesgos	404 días?	lun 04/01/16	vie 10/02/17																										
51		Administracion de Contratos	646 días?	lun 04/01/16	mar 10/10/17																										
52		Administracion de Sub Contratistas	646 días?	lun 04/01/16	mar 10/10/17																										
53		Termino de Proyecto	28 días?	vie 30/12/16	jue 26/01/17																										
54		Cierre de Proyecto	28 días?	vie 30/12/16	jue 26/01/17																										
55		Sumario del Proyecto	28 días?	vie 30/12/16	jue 26/01/17																										



29 ENE 2016

Proyecto: Cajamarca Acceso 23.12
 Fecha: jue 28/01/16


Tarea: Tarea manual Informe de resumen manual Sólo el comienzo Resumen manual Sólo fin

División: Resumen del proyecto Tareas externas Hito Hito externo Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración

Hitos: Hito Hito externo Hito inactivo Resumen inactivo

Legend: Resumen del proyecto Tareas externas Hito Hito externo Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Sólo el comienzo Resumen manual Sólo fin

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		PERIODO TOTAL DE IMPLEMENTACION	397 dias?	mié 30/12/15	dom 29/01/17
2		Firma del Contrato de Financiamiento	0 dias	mié 30/12/15	mié 30/12/15
3		Gestión del Proyecto	275 dias?	jue 31/12/15	vie 30/09/16
4		Elaboración de Propuesta Técnica	30 dias?	jue 31/12/15	vie 29/01/16
5		Entrega y Aprobación de Propuesta Técnica General	0 dias	vie 29/01/16	vie 29/01/16
6		Levantamiento de Observaciones de Propuesta Técnica General	10 dias?	vie 29/01/16	dom 07/02/16
7		Aprobación de Propuesta Técnica General	1 dia	lun 08/02/16	lun 08/02/16
8		Site Acquisition	50 dias?	mar 09/02/16	mar 29/03/16
9		Estudio de Campo Red de Transporte	40 dias?	mar 09/02/16	sáb 19/03/16
10		Diseño de Red Transporte Definitiva - Replanteo	30 dias?	dom 20/03/16	lun 18/04/16
11		Entrega de Propuesta Técnica Definitiva Mes 4	1 dia?	vie 29/04/16	vie 29/04/16
12		Entrega de Propuesta Técnica Definitiva Mes 9	1 dia?	vie 30/09/16	vie 30/09/16
13		Gestión de las Adquisiciones	161 dias	lun 04/01/16	dom 12/06/16
14		Preparación de orden de Compra Internacional de Infraestructura y equipos	6 dias?	lun 04/01/16	sáb 09/01/16
15		Fabricación y/o suministro de materiales y equipos	120 dias?	mar 05/01/16	mar 03/05/16
16		Transporte Internacional e Internamiento	30 dias?	mar 23/02/16	mié 23/03/16
17		Internamiento de equipos	19 dias?	jue 24/03/16	lun 11/04/16
18		Transporte Nacional a Almacén Central	20 dias?	lun 02/05/16	sáb 21/05/16
19		Compra local de Infraestructura y equipos	42 dias?	mié 24/02/16	mar 05/04/16
20		Fabricación y entrega equipamiento TELECOM Infraestructura y Materiales	56 dias?	lun 07/03/16	dom 01/05/16
21		Transporte Local (Almacén Central - Región de Despliegue)	42 dias?	lun 02/05/16	dom 12/06/16
22		Ejecución del Proyecto	378 dias?	lun 18/01/16	dom 29/01/17
23		Transporte local de equipos, Infraestructura y equipos (Desde Almacén Central a Montañas)	14 dias?	dom 22/05/16	sáb 04/06/16
24		Construcción de Obras Civiles	242 dias?	lun 22/02/16	jue 20/10/16
25		Instalación de Fibra Optica y Comisionamiento	186 dias?	lun 18/01/16	jue 21/07/16
26		Pruebas de equipos	20 dias?	vie 22/07/16	mié 10/08/16
27		Instalación de Equipos Red de Transporte	250 dias?	lun 21/03/16	vie 25/11/16
28		Culminación de Primer Avance - 63 Nodos de Distribución, Conexión y Core - 6 Nodos de Agregación MES 10	253 dias?	lun 22/02/16	lun 31/10/16
29		Entrega Total de la Red de Transporte - 51 Nodos de Distribución, Conexión y Core - 6 Nodos de Agregación MES 13	90 dias?	mar 01/11/16	dom 29/01/17
30		PUESTA EN OPERACIÓN RED DE TRANSPORTE	1 dia?	vie 13/01/17	vie 13/01/17
31		Monitoreo y Control	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
32		Monitoreo y Control de los trabajos del Proyecto	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
33		Autorización de Trabajos	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
34		Seguimiento de Avances	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
35		Manage Project Records	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
36		Mantenimiento del Cronograma del Proyecto	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
37		Mantenimiento del Plan de Trabajo	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
38		Manage Finances	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
39		Monitor de Costos	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
40		Control de Costo	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
41		Mantenimiento del Plan Financiero	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
42		Control de Calidad	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
43		Pruebas de Calidad	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
44		Niveles de Calidad	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
45		Monitoreo y Control de Riesgos	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
46		Administración de Riesgos	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
47		Administración de Contratos	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
48		Administración de Sub Contratistas	378 dias?	lun 04/01/16	dom 15/01/17
49		Termino de Proyecto	14 dias?	lun 16/01/17	dom 29/01/17
50		Cierre de Proyecto	14 dias?	lun 16/01/17	dom 29/01/17
51		Sumario del Proyecto	14 dias?	lun 16/01/17	dom 29/01/17

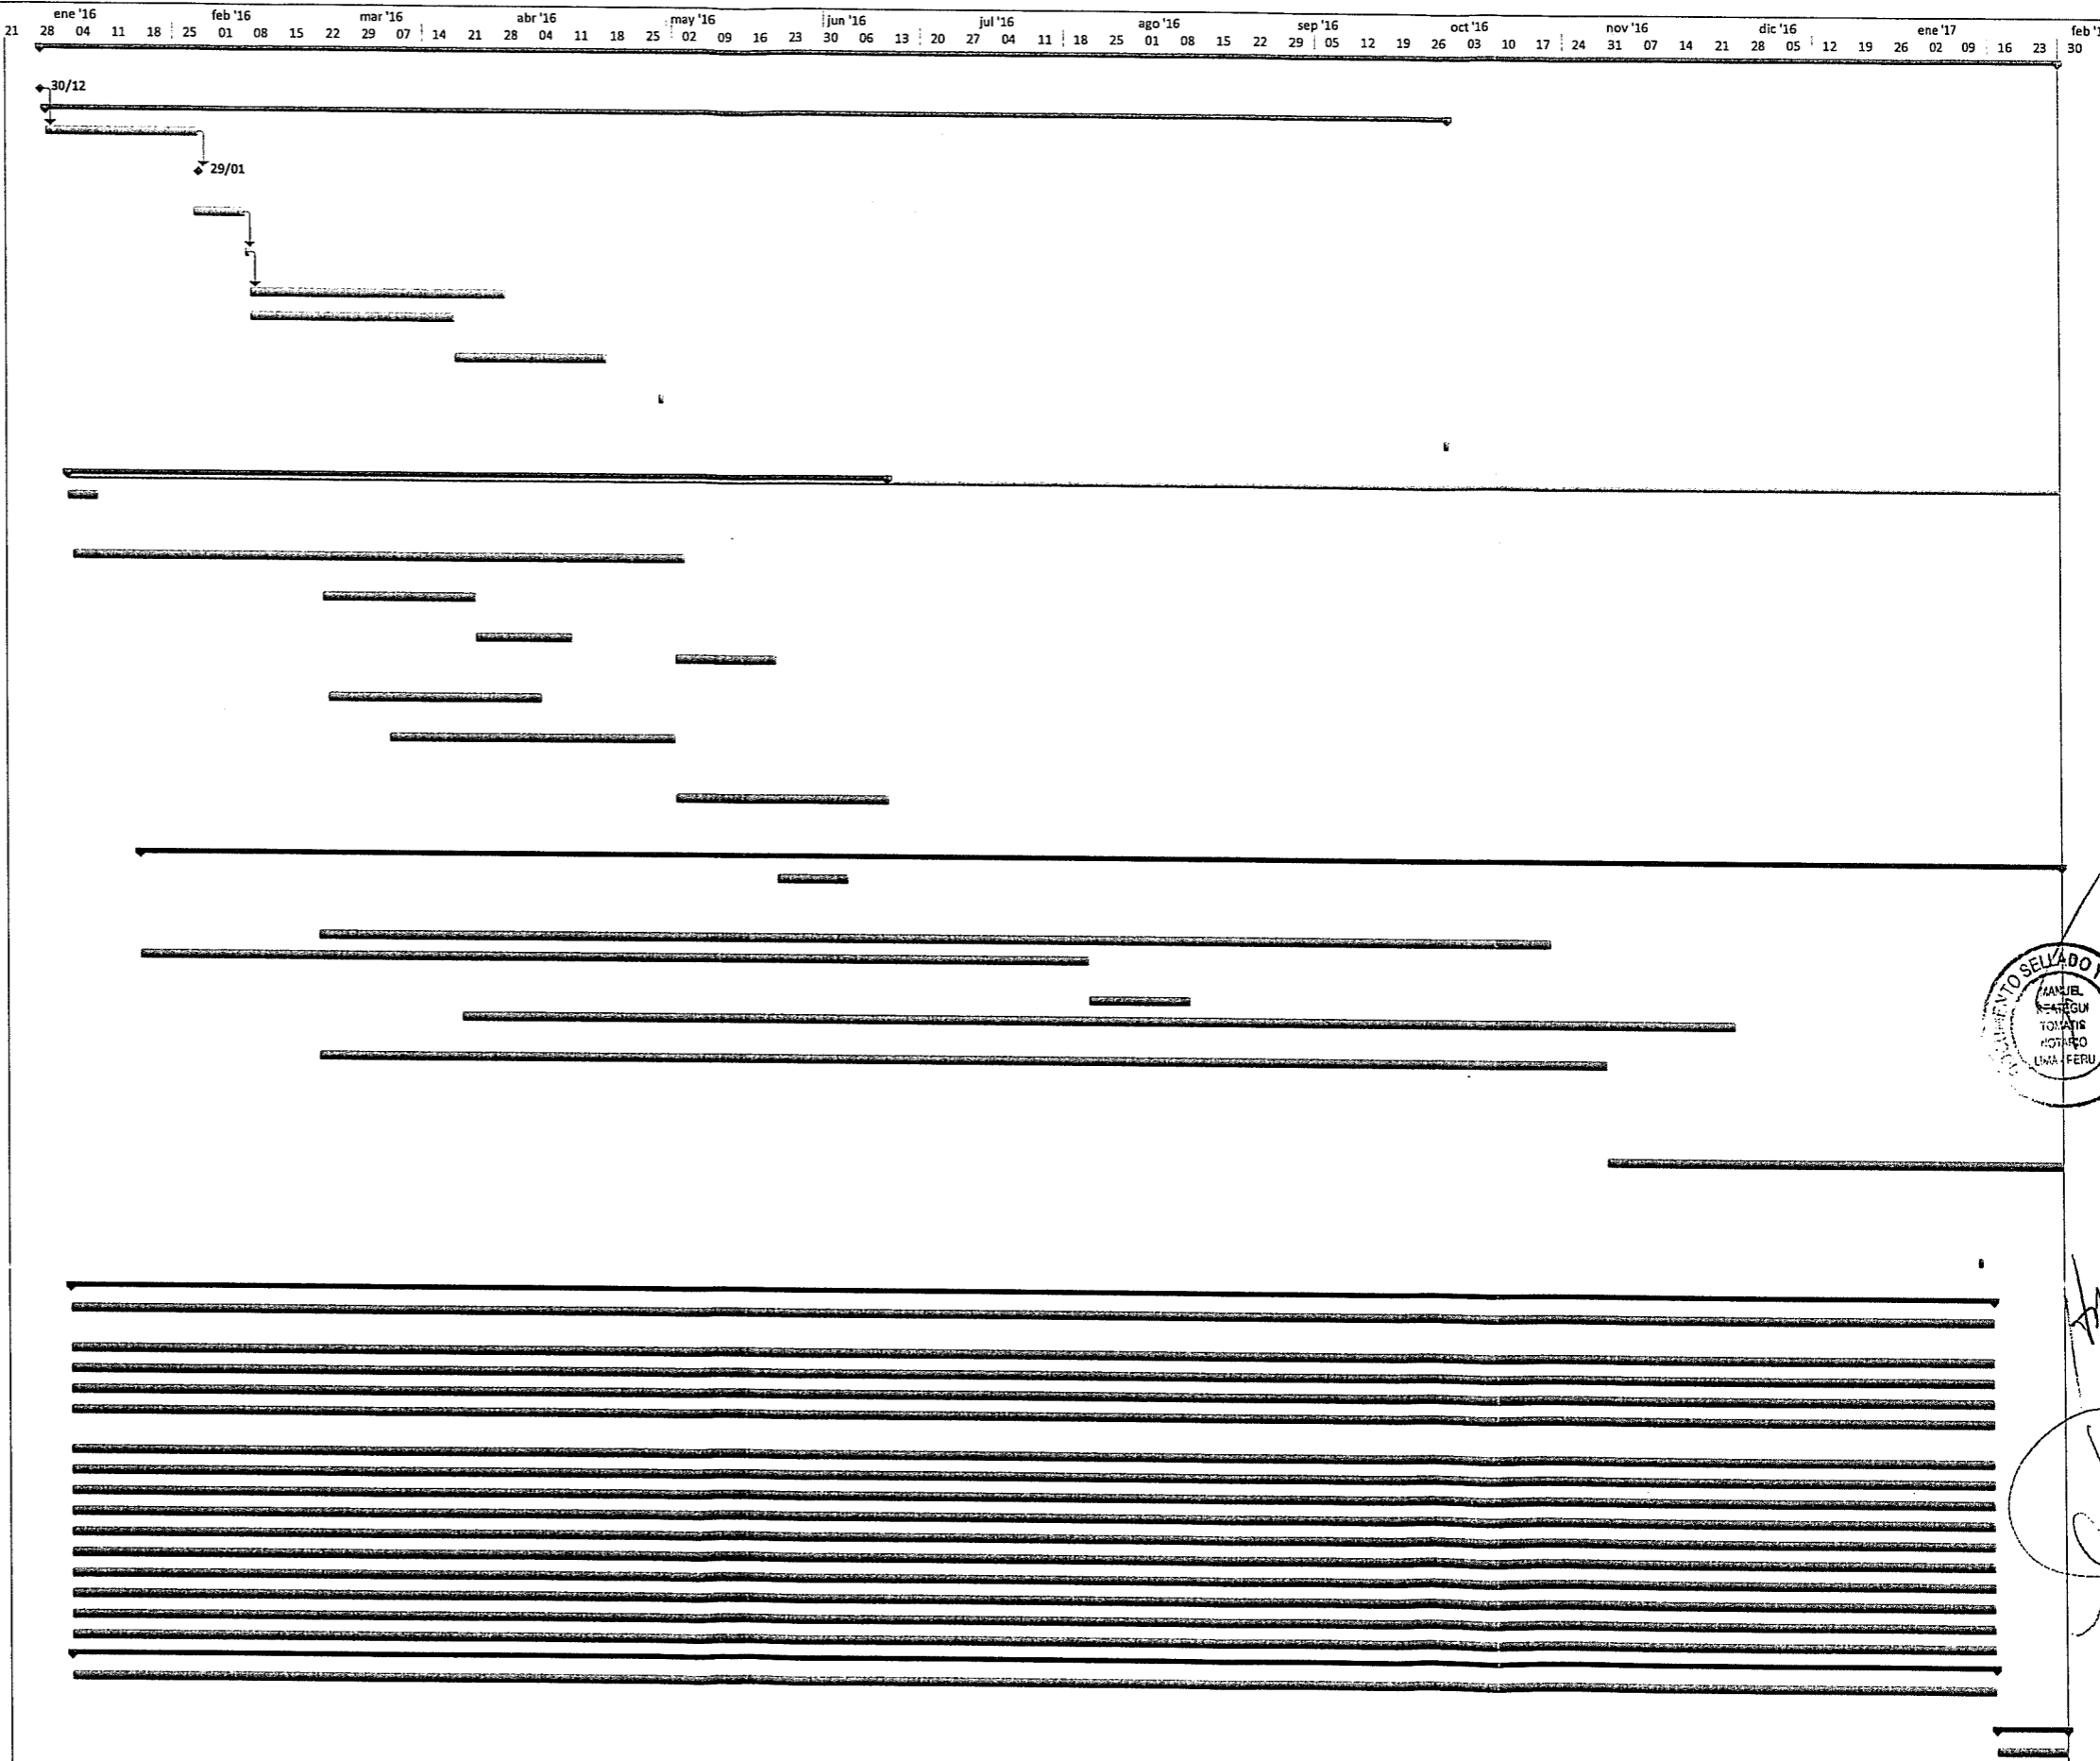

[Handwritten signature]

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 QUE SE ENVIO A LA VISTA
 29 EN 2016
 Fecha Inicia Proyecto
 [Handwritten signature]
 PUNTO DE VENTAS
